

Salmsteke - Schoonhoven

Verslag Ontwerp op tafel

Schoonhoven

23 oktober 2024

20.30 – 22.00 uur

Kenmerk HDSR: DM 2016175

In de bijlage bij dit verslag is de presentatie van de avond gevoegd.

Opening

Ingrid Iding heet iedereen welkom en licht het programma toe.

Indien vragen nog niet of onvoldoende zijn beantwoord, dan kunt u op het vragenformulier de vraag noteren.

Om 20.00 uur ronden we af.


Opmerkingen bij de dia's van de presentatie:

- Na nieuwe berekeningen, kennis en aanvullende informatie is de versterkingsopgave aangescherpt en zijn de versterkingsmaatregelen verder uitgewerkt ten opzichte van het voorkeursalternatief.
- De regie van de meekoppelkansen voor het herinrichten van de uiterwaarden is teruggegaan naar de Provincie. Deze meekoppelkansen wordt dus niet meer binnen het dijkversterkingsproject SAS uitgevoerd.
- Het vergunningenontwerp (VO) is een nadere uitwerking op het voorkeursalternatief (VKA) van de dijkversterking. Het VKA is in 2021 vastgesteld en met bewoners gedeeld. Door gedetailleerde gegevens over onder andere de bodemopbouw en toepassing van nieuwe rekenmethodieken is ten opzichte van het VKA de faalmechanismen waaraan de dijk bij Schoonhoven niet voldoet aangescherpt. De dijk bij Schoonhoven voldoet niet op de faalmechanismen piping en hoogte. Hierdoor is er op een gedeelte van de zone Schoonhoven een veiligheidsopgave (dijkpaal 177-187, bij dijkpaal 189 en tussen dijkpaal 190 en 191).
- In de kaart van de faalmechanismen is geen uitleg gegeven bij de afkortingen in de legenda. De toelichting wordt in het vervolg toegevoegd aan de presentatie. De afkortingen staan voor:

o Maatregel STPH:	Maatregel ten behoeve van Piping
o Maatregel STPH uitgesteld	Uitgestelde maatregel ten behoeve van Piping
o Maatregel GEKB	Erosie kruin en binnentalud (hoogte)
o Maatregel GABI uitgesteld	Afschuiving bekleding binnentalud
- De uitvoering van de werkzaamheden van de dijkversterking vindt naar verwachting plaats in 2028-2030. Dit is de uitvoeringsperiode voor het gehele traject van Salmsteke-Schoonhoven. Bewoners geven aan dat ze het erg lang vinden duren.

'Ontwerp op tafel'

Figuur 1: Tekening Inpassing ontwerp SAS Schoonhoven

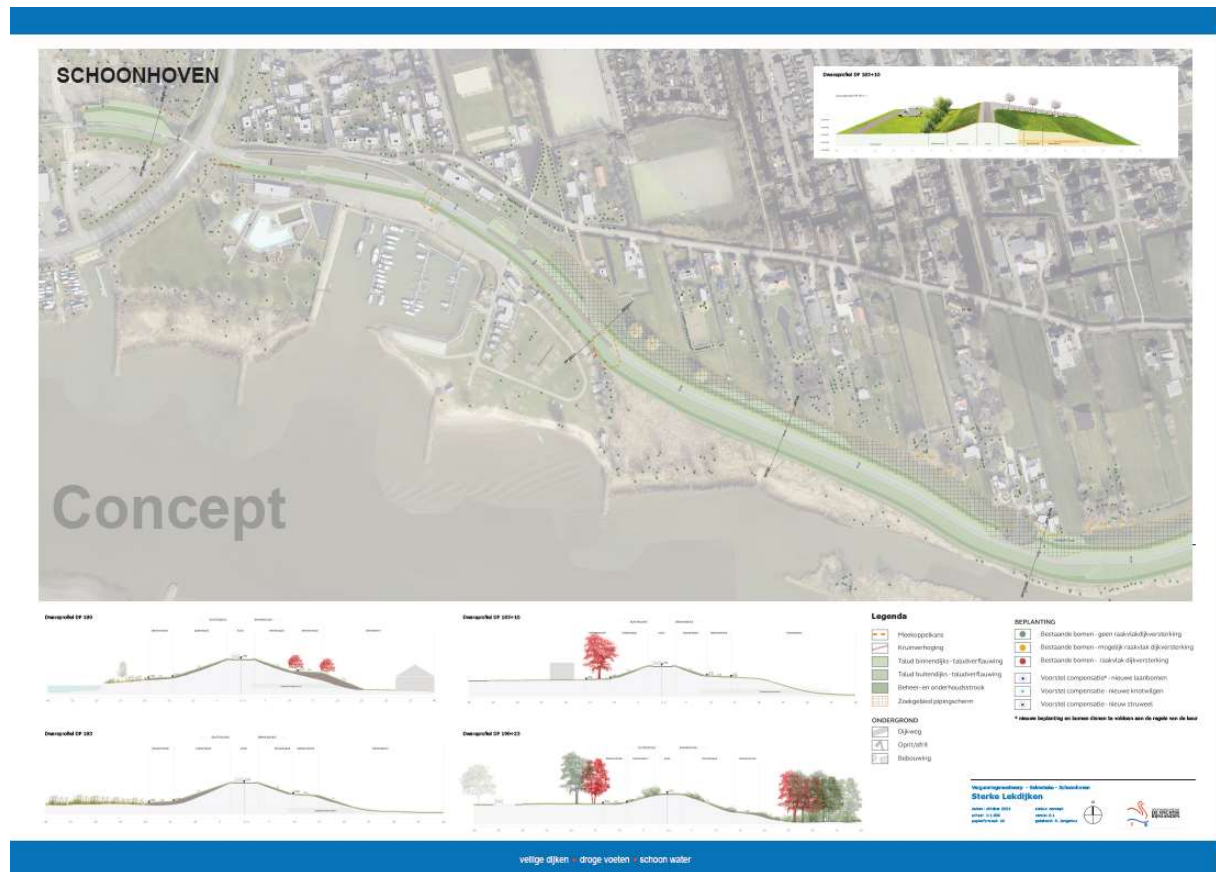

Opmerkingen bij de tekeningen

Aan de hand van geprinte tekeningen op A0-formaat zijn bewoners met de leden van het projectteam in gesprek gegaan over de dijk van SAS.

- Archeologie: Verhaal gaat dat resten van kasteel Schoonhoven zijn verwerkt in dijk bij Schoonhoven.
- Beheerstrook binnenzijde: na verwerving en als beheer bij HDSR blijft angst dat mensen gaan wandelen op beheerstrook binnenzijde (want geen afrastering) net als op dit moment aan de buitenzijde gebeurt.
- Nabij DP 186-187: talud 1:3 ingetekend en direct bij het huis is er geen aanpassing van het talud. Hoe kan dat? Hoeveel is de hoogte opgave?
- Veel wandelaars op de dijk en beneden de dijk bij entree Schoonhoven

Afsluiting en reactie

De volgende reacties zijn gedaan:

- Nuttige avond, maar de volgende afspraak moet niet te lang duren. De keukentafelgesprekken worden in de komende maanden ingepland. We willen iedereen in heel dijktraject SAS uiterlijk in het 1e kwartaal van 2025 gesproken hebben.
- Wordt er nog een bewonersavond gehouden voordat het projectplan ter inzage gaat? Dan wordt er inderdaad nog een avond georganiseerd.
- Ik waardeer deze avond. Maar ik zou graag zien dat er meer wordt teruggekoppeld door het project.

Ingrid Iding bedankt iedereen voor hun komst.
